

6. 建設工事の進捗状況について

(9) 平成29年12月～平成30年3月

擁壁工事：12月中旬にかけて建設用地東側で擁壁工事を進めました。

① L型擁壁設置




② L型擁壁設置



屋根工事：配筋工を行い、コンクリート打設後に屋根葺きをしました。

③ 屋根配筋

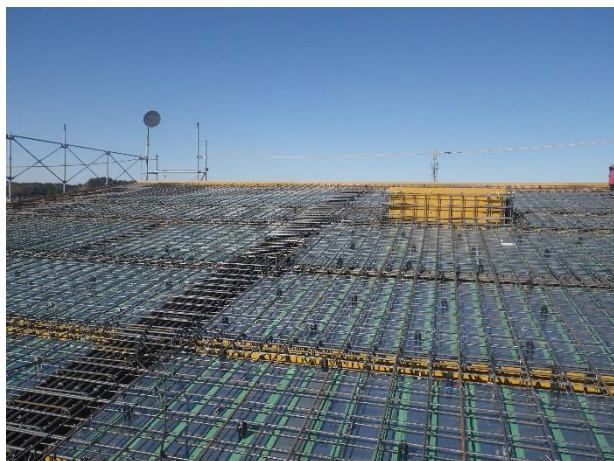

④ 屋根葺き (全景)



機器据付配管工事：ポンプ類等の機器据付を行いました。

⑤ 機器据付



⑥ 機器据付



脱臭ダクト工事：脱臭ダクトの布設を行いました。

⑦脱臭ダクト布設



⑧脱臭ダクト布設



トラックスケール工事：トラックスケールの鉄骨建込を行い、本体設置後に屋根を取り付けました。

⑨トラックスケール鉄骨建込



⑩トラックスケール屋根取付



建屋工事：外壁塗装を終え、足場を解体し建屋工事が完了しました。

⑪全景（正面）



⑫全景（3月現在）



現在は施設竣工に向け、内装工事・電気工事を進めております。
